

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА

**«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН К КОММУНИКАЦИЯМ.....	4
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.....	9
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФОРМАТОВ И СОДЕРЖАНИЯ.....	10
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ.....	11
РЕСУРСЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ.....	12
ПРОЦЕСС ЭСКАЛАЦИИ.....	14
ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА.....	16
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ.....	19
СХЕМЫ ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ.....	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План управления коммуникациями разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С:Предприятие 8.3» и является неотъемлемым компонентом Плана управления проектом. Основная цель документа - создание единой системы коммуникационных процессов, обеспечивающей эффективный и своевременный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами проекта.

Ключевые задачи плана:

- Определение потребностей стейкхолдеров в информации
- Установление стандартов и процедур коммуникации
- Создание эффективной системы отчетности
- Обеспечение прозрачности проектной деятельности
- Минимизация коммуникационных рисков
- Оптимизация времени, затрачиваемого на коммуникации

Документ распространяется на всех участников проекта без исключений: команда проекта, управляющий комитет, ключевые показатели, внешние исполнители, функциональные руководители задействованных подразделений.

Документ является динамическим инструментом управления и может быть скорректирован в установленном порядке по мере развития проекта и изменения потребностей стейкхолдеров.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН К КОММУНИКАЦИЯМ

Требования к коммуникациям были выявлены в процессе анализа заинтересованных сторон проекта через серию интервью, анкетирование и рабочие встречи. Для каждой группы стейкхолдеров определены оптимальные каналы, частота и формат коммуникаций, обеспечивающие эффективное взаимодействие и удовлетворение информационных потребностей.

Управляющий комитет проекта

Состав:

- Спонсор проекта: Макаров Г.Д.
- Генеральный директор: Назаров А.А.

Информационные потребности:

- Стратегические решения и ключевые показатели проекта
- Финансовая отчетность и использование бюджета
- Критические риски и проблемы, требующие эскалации
- Достижение ключевых вех и контрольных точек
- Изменения, влияющие на бизнес-цели проекта

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежемесячные отчетные совещания
- Формат: Презентации с акцентом на визуализацию данных
- Уровень детализации: Высокоуровневый, с концентрацией на бизнес-показателях
- Каналы: Личные встречи, официальные email-отчеты
- Язык: Деловой русский, с минимальным использованием технической терминологии

Критические требования:

- Максимальное время реакции на эскалированные вопросы - 24 часа
- Обязательное предоставление вариантов решений для рассматриваемых проблем
- Финансовая информация должна быть представлена в сравнении с плановыми показателями

Руководитель проекта

Состав:

- Ответственный: Кочеткова М.П.

Информационные потребности:

- Детальная информация о статусе всех задач проекта
- Проблемы и риски на операционном уровне
- Ресурсная загрузка и производительность команды
- Качество выполняемых работ и соответствие стандартам
- Обратная связь от всех групп стейкхолдеров

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежедневное взаимодействие с командой
- Формат: Разнообразный - от кратких устных обсуждений до детальных письменных отчетов
- Уровень детализации: Детальный, с возможностью drilling down до уровня конкретных задач
- Каналы: Непосредственное общение, мгновенные сообщения, email, системы управления проектами
- Язык: Профессиональный, с использованием как бизнес-так и технической терминологии

Критические требования:

- Ежедневное обновление информации о статусе критических задач
- Немедленное уведомление о проблемах, угрожающих срыву сроков
- Регулярная формализованная обратная связь от команды проекта

Команда проекта (внутренние участники)

Состав:

- Ключевые пользователи от торгового отдела, склада, бухгалтерии
- Сотрудники ИТ-отдела

Информационные потребности:

- Четкие и однозначные требования и задачи
- Технические спецификации и стандарты выполнения работ
- Расписание работ и сроки выполнения задач

- Информация о изменениях в требованиях и подходах
- Обратная связь по результатам работы

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежедневные оперативные взаимодействия
- Формат: Четкие письменные задания, протоколы совещаний
- Уровень детализации: Детальный, с конкретными инструкциями
- Каналы: Системы управления задачами, email, регулярные совещания
- Язык: Профессиональный, с учетом специализации участников

Критические требования:

- Минимизация непродуктивных совещаний
- Четкие и измеримые критерии приемки работ
- Своевременное предоставление необходимой информации для выполнения задач

Внешние исполнители

Состав:

- Бизнес-аналитик (консалтинговая компания)
- Программист 1С (сертифицированный партнер)
- Тестировщик (ИТ-компания)
- Тренер (учебный центр 1С)

Информационные потребности:

- Технические задания и спецификации требований
- Графики работ и сроки поставки результатов
- Информация о изменениях в требованиях
- Обратная связь по предоставляемым результатам
- Информация о процедурах приемки работ

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Согласно графикам, определенным в договорах
- Формат: Формализованные документы, официальная переписка
- Уровень детализации: Детальный, с технической спецификой

- Каналы: Email, системы документооборота, специализированные платформы
- Язык: Профессиональный, с использованием технической терминологии

Критические требования:

- Своевременное предоставление исходных данных для работы
- Четкие процедуры согласования и приемки работ
- Формализованная система управления изменениями требований

В рамках проекта устанавливаются строгие требования к защите конфиденциальной информации, основанные на категоризации данных по уровням доступа. К информации ограниченного распространения относятся:

- Финансовые данные проекта - доступ только для Управляющего комитета и руководителя проекта
- Персональные данные сотрудников - в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
- Коммерческая тайна компании - защита в соответствии с корпоративными политиками

Для каждой категории информации определены санкционированные каналы передачи, методы шифрования и правила хранения, при этом ведется обязательный журнал доступа ко всем чувствительным данным.

Обеспечение непрерывности коммуникационных процессов является критическим требованием для успешной реализации проекта.

- Критическая информация должна быть доступна 24/7 через защищенные каналы
- Резервные каналы коммуникации на случай сбоев основных систем
- Регламентированные сроки ответа на запросы различных категорий

Система уведомлений реализуется через многоуровневые оповещения, включая автоматические email-уведомления, push-уведомления в корпоративном мессенджере и, при необходимости, SMS-информирование для членов Управляющего комитета.

Унификация языка коммуникаций и терминологии является необходимым условием для предотвращения недопонимания между разнородными группами участников проекта.

- Основной язык коммуникаций - русский
- Техническая документация может дублироваться на английском языке при необходимости
- Обеспечение понимания терминологии всеми участниками проекта

Требования к коммуникациям подлежат регулярному пересмотру:

- Ежеквартальный плановый пересмотр
- Внеплановый пересмотр при изменении состава стейкхолдеров
- Корректировка при изменении организационной структуры проекта
- Обновление при изменении технологической инфраструктуры

Актуализация требований осуществляется руководителем проекта с обязательным согласованием с заинтересованными сторонами. Изменения в требованиях формируются в виде дополнений к настоящему плану.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стратегическая информация включает информацию, необходимую для принятия управленческих решений на высшем уровне. Эта информация предназначена преимущественно для Управляющего комитета и спонсора проекта, характеризуется высокоуровневым представлением данных с акцентом на визуализацию и аналитику, и распространяется в формате PDF-отчетов и презентаций PowerPoint.

Тактическая информация охватывает данные, необходимые для оперативного управления проектом и координации работ. Основными потребителями тактической информации являются руководитель проекта и руководители функциональных подразделений. Информация представляется в структурированном виде с средним уровнем детализации, преимущественно в формате Excel и Word, а также через дашборды в системе управления проектами.

Операционная информация включает детальные данные, необходимые для непосредственного выполнения работ участниками проектной команды. Данная категория информации предназначена для бизнес-аналитиков, программистов, тестировщиков, тренеров и ключевых

пользователей. Форматы представления варьируются от специализированных (XML, JSON для технических спецификаций) до стандартных (Word, PDF, видеоинструкции), с максимально возможным уровнем детализации.

В информацию для внешнего распространения входят сведения, предназначенные для стейкхолдеров, не входящих в непосредственный состав проектной команды, но заинтересованных в ходе проекта. Информация носит общедоступный характер, представляется в адаптированном, не техническом формате, таком как HTML-страницы на корпоративном портале, email-рассылки и буклеты, и строго проверяется на соответствие корпоративным стандартам коммуникаций.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФОРМАТОВ И СОДЕРЖАНИЯ

Отчет о статусе проекта

- Назначение: Информирование Управляющего комитета и спонсора о текущем состоянии проекта.
- Содержание:
 - Исполнительное резюме: Краткий обзор статуса (по зеленому/желтому/красному принципу), ключевые достижения за период, основные проблемы.
 - Прогресс: Процент завершения по основным вехам, график выполненных работ (S-кривая).
 - Бюджет и затраты: Фактические затраты vs. план (CV, CPI), прогноз по завершении (EAC).
 - Ключевые риски и проблемы: Топ-5 текущих рисков с оценкой вероятности и воздействия, список актуальных проблем.
 - Планы на следующий период: Перечень основных целей и запланированных активностей.
- Формат: Презентация PowerPoint (не более 10 слайдов) и PDF-документ.
- Язык: Русский, деловой стиль, минимум технических терминов.

Техническое задание (ТЗ) и спецификации

- Назначение: Формальное описание требований к системе для разработчиков и тестировщиков.

- Содержание:
 - Детальное описание бизнес-требований и функциональности.
 - Нефункциональные требования (производительность, безопасность).
 - Модели бизнес-процессов "как есть" и "как будет".
 - Сценарии использования (Use Cases).
 - Интерфейсы интеграции с другими системами.
- Формат: Документ MS Word с использованием единого шаблона, диаграммы в BPMN/UML.
- Язык: Русский, с использованием технической терминологии.

Протокол совещания

- Назначение: Фиксация решений, принятых на совещании, и назначенных действий.
- Содержание:
 - Дата, время, список участников.
 - Повестка дня.
 - Краткое содержание обсуждения по каждому пункту.
 - Принятые решения.
 - Список действий (Action Items): что сделать, кто ответственный, срок выполнения.
- Формат: Документ MS Word (шаблон), размещается в Confluence.
- Язык: Русский, лаконичный и структурированный стиль.

Дашборд в системе управления проектами

- Назначение: Обеспечение прозрачности хода работ для всех членов команды.
- Содержание:
 - Текущий статус задач (To Do, In Progress, Done).
 - Визуализация рабочих процессов (Kanban, Scrum-доски).
 - Графики сгорания задач (Burndown Charts).
 - Распределение задач по исполнителям.
- Формат: Онлайн-дашборд в Jira, доступный по правам.
- Язык: Русский (локализация интерфейса), термины из предметной области.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ

Синхронные методы коммуникации предполагает одновременное участие сторон в процессе коммуникации и обеспечивает немедленный обмен информацией. К синхронным методам относятся:

- *Личные совещания и рабочие сессии.* Применяются для проведения ежемесячных отчетных совещаний с Управляющим комитетом, стратегических сессий по планированию этапов проекта и рабочих встреч по решению критических проблем.
- *Виртуальные совещания через платформы видеоконференцсвязи.* Применяются для ежедневных стендапов команды проекта, еженедельных оперативных совещаний и внеплановых обсуждений с внешними исполнителями.
- *Телефонные звонки и голосовая связь.* Применяются для экстренной связи с ключевыми стейкхолдерами, уточнения срочных деталей и оперативного согласования простых решений.

Асинхронные методы коммуникации не требуют одновременного участия сторон и позволяют получать и обрабатывать информацию в удобное время. К асинхронным методам относятся:

- *Электронная почта.* Является основным каналом для официальной переписки, рассылки утвержденных документов, отправки формальных уведомлений и ведения исторической записи коммуникаций.
- *Корпоративный мессенджер.* Применяется для быстрого обмена сообщениями, оперативных уточнений, неформального общения в тематических каналах и чатах.
- *Системы управления проектами (Jira) и совместной работы (Confluence).* Jira используется для формализованного обсуждения задач, заведения дефектов, комментирования и отслеживания истории изменений. Confluence служит единой базой знаний для публикации и комментирования проектной документации, ведения протоколов совещаний и размещения рабочих инструкций.

Методы распространения и публикации информации:

- Корпоративный портал и информационные панели (Dashboards)
- Рассылки уведомлений и оповещений

РЕСУРСЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ

Общий бюджет на коммуникационные нужды проекта составляет 175 000 рублей и распределяется по следующим статьям затрат:

Программное обеспечение и лицензии: 50 000 рублей

- Назначение: Приобретение и продление лицензий на корпоративный пакет Microsoft 365 (E3), лицензии Jira Software и Confluence, лицензии Zoom Pro.
- Обоснование: Обеспечение базовой технологической платформы для всех видов коммуникаций.
- Периодичность затрат: Единовременно/ежегодное продление.

Аппаратное обеспечение и инфраструктура: 100 000 рублей

- Назначение: Закупка гарнитур для участников команды, веб-камер для улучшения качества видеосвязи, апгрейд оборудования в основной переговорной комнате (микрофонная система, камера).
- Обоснование: Создание комфортных и технически оснащенных условий для проведения эффективных совещаний, особенно в режиме удаленной работы.
- Периодичность затрат: Единовременно.

Обучение и развитие: 25 000 рублей

- Назначение: Проведение обучающих сессий по эффективному использованию Jira/Confluence для команды проекта и ключевых пользователей; курс по деловым коммуникациям для руководителя проекта.
- Обоснование: Повышение эффективности использования инструментов и культуры коммуникаций в проекте.
- Периодичность затрат: Единовременно.

Ответственный управлением бюджетом является руководитель проекта. Процедура контроля - это ежемесячный мониторинг фактических затрат в сравнении с плановыми показателями. Закладываемый резерв составляет 10% (17 500 рублей) на непредвиденные коммуникационные расходы. Использование резерва согласовывается с Спонсором проекта.

Общие плановые трудозатраты на коммуникационную деятельность составляют 60 человеко-часов в месяц и распределяются следующим образом:

- Руководитель проекта: 40 часов/месяц
 - Назначение: Подготовка и проведение совещаний (УК, оперативные), написание и рассылка статус-отчетов, индивидуальные коммуникации со стейкхолдерами, разрешение конфликтов, обновление коммуникационного плана.
 - Обоснование: Коммуникация является ключевой функцией руководителя проекта.
- Администратор систем / Координатор проекта: 20 часов/месяц
 - Назначение: Техническая поддержка коммуникационных систем (настройка видеоконференций, прав доступа), администрирование Jira/Confluence (создание проектов, настройка рабочих процессов), помощь в подготовке и оформлении коммуникационных материалов, ведение архива коммуникаций.
 - Обоснование: Обеспечение бесперебойной работы инструментов и разгрузка руководителя проекта от технических задач.

ПРОЦЕСС ЭСКАЛАЦИИ

Процесс эскалации предназначен для систематического и своевременного разрешения вопросов и проблем, которые не могут быть решены на текущем уровне ответственности. Эскалация обеспечивает привлечение руководителей с соответствующими полномочиями для принятия решений, предотвращая блокировку работ и минимизируя негативное влияние на ход проекта.

Уровень 1: Решение в рамках проектной команды

- Участники: Ответственные исполнители, руководитель проекта.
- Временные рамки: До 24 часов с момента идентификации проблемы.
- Компетенция: Решение операционных вопросов, не требующих изменения утвержденных параметров проекта (содержания, сроков, бюджета).

- Незначительные корректировки в расписании не критичных задач.
- Процедура: Обсуждение на ежедневных стендапах, в чатах команды, оперативных совещаниях.

Уровень 2: Эскалация руководителю проекта

- Участники: Руководитель проекта, ответственные исполнители.
- Временные рамки: До 48 часов с момента эскалации.
- Компетенция: Решение тактических вопросов, влияющих на отдельные задачи в рамках утвержденного плана.
- Процедура: Оформление запроса на эскалацию по установленной форме, рассмотрение руководителем проекта на ближайшем оперативном совещании.

Уровень 3: Эскалация в Управляющий комитет проекта

- Участники: Управляющий комитет (Спонсор проекта, Генеральный директор), Руководитель проекта.
- Временные рамки: До 72 часов с момента эскалации.
- Компетенция: Решение стратегических вопросов, требующих изменения утвержденных параметров проекта.
- Процедура: Оформление формального запроса на изменение, рассмотрение на ближайшем заседании Управляющего комитета.

Уровень 4: Эскалация Спонсору проекта

- Участники: Спонсор проекта, Генеральный директор, Руководитель проекта.
- Временные рамки: Немедленно/в течение 24 часов для критических вопросов.
- Компетенция: Решение критических вопросов, оказывающих существенное влияние на успех проекта.
- Процедура: Немедленное уведомление по телефону с последующим оформлением формального запроса.

Любой участник проекта, столкнувшийся с проблемой, которая не может быть решена на его уровне полномочий или угрожает достижению целей проекта, обязан инициировать процедуру эскалации. Первым шагом является четкая фиксация проблемы в установленной форме. Инициатор заполняет раздел, включающий:

- Описание проблемы: Лаконичное и конкретное изложение сути проблемы, без эмоциональной окраски. Указывается, что произошло, когда и в каком контексте.
- Анализ воздействия: Оценка влияния проблемы на ключевые параметры проекта — содержание (какие работы блокируются или требуют пересмотра), сроки (вехи и общая дата завершения), бюджет (дополнительные затраты или использование резервов), качество (снижение характеристик результата) и риски (потенциальное возникновение новых угроз).
- Предлагаемые варианты решения: Инициатор представляет один или несколько возможных путей решения проблемы с кратким анализом преимуществ и недостатков каждого. Это демонстрирует проактивность и помогает лицам, принимающим решения, в их оценке.
- Рекомендуемый уровень эскалации: На основе анализа воздействия инициатор предлагает, на какой уровень управления следует направить вопрос (Уровень 2, 3 или 4), руководствуясь матрицей полномочий, описанной в разделе 8.2.
- Желаемый срок решения: Указывается желательная дата или период, к которому необходимо принять решение, исходя из критичности проблемы для графика проекта.

После заполнения описанных пунктов инициатор оформляет унифицированную «Форму запроса на эскалацию» (ФЗЭ). Форма является электронным документом в системе Confluence/Jira и содержит следующие обязательные реквизиты:

- Уникальный идентификатор запроса: Присваивается автоматически системой.
- Дата и время инициирования.
- ФИО и роль инициатора.
- Краткое название проблемы.
- Ссылка на связанные задачи или документы в Jira/Confluence.
- Раздел для истории коммуникаций по данному вопросу.

Ответственное лицо, получившее ФЗЭ, обязано в течение 2 рабочих часов подтвердить получение запроса, изменив его статус в системе на «Принят в работу».

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА

План управления коммуникациями является динамичным документом, который требует регулярного пересмотра и актуализации для обеспечения своей релевантности и эффективности на протяжении всего жизненного цикла проекта. Основная цель обновлений — адаптация коммуникационных процессов к изменяющимся условиям проекта, потребностям заинтересованных сторон и извлеченным урокам.

План подлежит обязательному пересмотру в следующих случаях:

- Изменение состава заинтересованных сторон: Появление новых ключевых стейкхолдеров или исключение существующих, изменение их ролей, уровня влияния или информационных потребностей.
- Корректировка содержания проекта (Change Request): Утвержденные изменения в содержании, которые затрагивают границы проекта, ключевые результаты или основные вехи.
- Существенные изменения в расписании или бюджете: Сдвиги в сроках выполнения ключевых этапов, превышение бюджета, требующее пересмотра коммуникационных ресурсов.
- Смена ключевых участников проекта: Назначение нового руководителя проекта, спонсора или замены ключевых исполнителей.
- Изменение организационной структуры или бизнес-процессов компании: Реорганизации, слияния, изменения в корпоративной политике или стратегии.
- Результаты мониторинга эффективности коммуникаций: Систематическое несоответствие коммуникационных процессов установленным KPI, негативная обратная связь от стейкхолдеров.
- Изменение технологической инфраструктуры: Внедрение новых или отказ от старых инструментов коммуникации.
- Форс-мажорные обстоятельства: Возникновение непредвиденных событий, существенно влияющих на коммуникационные процессы.

Установлена следующая обязательная периодичность пересмотра Плана управления коммуникациями:

- Плановый пересмотр: Проводится на ежеквартальной основе в рамках подготовки квартального отчета Управляющему комитету.
- Внеплановый пересмотр: Иницируется по мере необходимости при наступлении событий.

Процесс обновления плана включает следующие этапы:

1. Инициация обновления:
 - Любой участник проекта может предложить изменение, направив запрос Руководителю проекта.
 - Руководитель проекта анализирует обоснованность запроса и принимает решение о начале процедуры обновления.
2. Анализ воздействия предлагаемых изменений:
 - Руководитель проекта оценивает, как предлагаемые изменения повлияют на текущие коммуникационные процессы, ресурсы, расписание и стейкхолдеров.
 - Проводится при необходимости мини-опрос или интервью с ключевыми стейкхолдерами для сбора обратной связи.
3. Разработка проекта изменений:
 - Руководитель проекта вносит правки в черновую версию плана.
 - Изменения документируются в виде списка правок с обоснованием каждого изменения.
4. Согласование проекта изменений:
 - Проект обновленного плана рассылается на согласование ключевым стейкхолдерам, которых затрагивают изменения (например, руководителям подразделений, чьи сотрудники вовлечены в проект).
 - На согласование отводится 5 рабочих дней.
5. Утверждение обновленного плана:
 - Окончательная версия плана утверждается Руководителем проекта.
 - Изменения, затрагивающие бюджет, сроки или содержание проекта, подлежат дополнительному утверждению Управляющим комитетом.
6. Публикация и доведение до сведения:
 - Утвержденная версия плана публикуется в центральном репозитории проекта (Confluence).

- Все участники проекта уведомляются о выходе новой версии и ключевых изменениях через email-рассылку и анонс в общем канале Microsoft Teams.
- В уведомлении кратко перечисляются основные изменения и их влияние на работу участников.

7. Архивация предыдущей версии:

- Предыдущая версия плана сохраняется в архиве проекта для обеспечения прослеживаемости изменений.

Руководитель проекта несет персональную ответственность за инициирование, координацию и выполнение процесса обновления плана, а также за его итоговое качество и актуальность.

Члены команды проекта и Ключевые пользователи обязаны своевременно предоставлять обратную связь и предложения по улучшению коммуникационных процессов.

Управляющий комитет осуществляет контроль за своевременностью и обоснованностью обновлений, особенно в части, касающейся стратегических коммуникаций и использования ресурсов.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Заинтересованная сторона (Стейкхолдер): Физическое или юридическое лицо, группа или организация, которые активно участвуют в проекте, либо чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения или по завершении проекта.

Эскалация: Формальная процедура передачи вопроса, проблемы или риска на более высокий уровень управления для своевременного принятия решения.

Статус-отчет (Status Report): Регулярный документ, информирующий заинтересованных сторон о текущем состоянии проекта, включая прогресс, ключевые проблемы, риски и планы.

Ключевые пользователи (Key Users): Сотрудники заказчика, представляющие бизнес-пользователей будущей системы, участвующие в сборе требований, тестировании и приемке.

Управляющий комитет (Steering Committee): Высший коллегиальный орган управления проектом, состоящий из ключевых руководителей, осуществляющий стратегическое руководство и контроль.

Спонсор проекта (Project Sponsor): Ключевая фигура, представляющая интересы бизнеса, наделяющая проект полномочиями и ресурсами, несущая ultimate ответственность за его успех.

Тройственное ограничение (Triple Constraint): Фундаментальная концепция управления проектами, описывающая баланс между содержанием, сроками и бюджетом.

Базовый план (Baseline): Утвержденная версия расписания, бюджета или содержания проекта, используемая в качестве эталона для сравнения с фактическими показателями.

1С: Предприятие 8.3: Платформа для автоматизации бизнес-процессов, на которой разворачивается прикладное решение.

Конфигурация: Прикладное решение, созданное на платформе "1С: Предприятие" для автоматизации конкретных видов учета (например, "Торговля и склад").

Типовая конфигурация: Конфигурация, разработанная фирмой "1С" и распространяемая как тиражное решение.

Доработка (Кастомизация): Изменение типовой конфигурации или разработка новых функциональных модулей для удовлетворения специфических требований заказчика.

Промышленная эксплуатация (Production): Стадия жизненного цикла системы, на которой она используется для выполнения реальных бизнес-процессов после успешного завершения внедрения и опытной эксплуатации.

Канал коммуникации (Communication Channel): Средство или путь, используемый для передачи информации от отправителя к получателю (например, email, совещание, мессенджер).

Синхронная коммуникация (Synchronous Communication): Обмен информацией в реальном времени, когда участники взаимодействуют одновременно (например, видеозвонок, личная встреча).

Асинхронная коммуникация (Asynchronous Communication): Обмен информацией, при котором между отправкой сообщения и получением ответа проходит время, и участникам не требуется присутствовать одновременно (например, email, сообщения в чате).

Дашборд (Dashboard): Визуальная панель, отображающая ключевые метрики и показатели проекта в режиме, близком к реальному времени.

Репозиторий (Repository): Централизованное хранилище для данных, документов и другой информации проекта (например, Confluence).

NDA (Non-Disclosure Agreement): Соглашение о конфиденциальности, юридически обязывающее стороны не разглашать определенную информацию.

Бизнес-процесс (Business Process): Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.

Техническое задание (ТЗ) (Technical Specification): Документ, содержащий технические и функциональные требования к системе, являющийся основой для проектирования, разработки и тестирования.

Критерий приемки (Acceptance Criteria): Набор условий, которые должны быть выполнены, чтобы результат работы или проекта считался принятым заказчиком.

Миграция данных (Data Migration): Процесс переноса исторических данных из старых систем учета во внедряемую систему 1С.

Опытная эксплуатация (Pilot Operation): Пробная эксплуатация системы ограниченным кругом пользователей в реальных бизнес-условиях перед полным развертыванием.

KPI (Key Performance Indicator): Ключевой показатель эффективности, количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.

Веха (Milestone): Значительное событие в проекте, отмечающее завершение ключевого этапа работ, не имеющее продолжительности во времени.

Риск (Risk): Неопределенное событие или условие, которое в случае наступления оказывает положительное или отрицательное воздействие на цели проекта.

Реестр рисков (Risk Register): Документ, содержащий результаты идентификации рисков, результаты качественного и количественного анализа рисков, а также план реагирования на риски.

Запрос на изменение (Change Request): Формальное предложение по модификации любого документа, deliverables, или базового плана проекта.

СХЕМЫ ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ

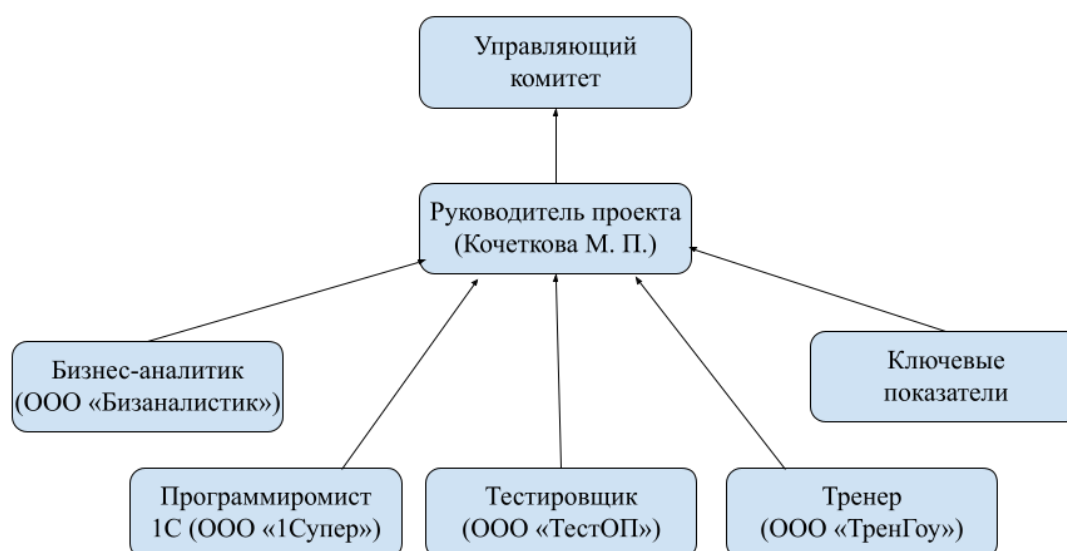


Рисунок 1. Общая схема коммуникаций

ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ

Защита персональных данных

- Основание: Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Ограничение: Запрещена передача персональных данных сотрудников (ФИО, должности, контактные данные) через незашифрованные или публичные каналы связи, такие как открытые email-рассылки, общедоступные мессенджеры или файлообменники. Любая коммуникация, содержащая персональные данные, должна осуществляться через корпоративные системы, обеспечивающие

шифрование трафика (например, защищенные каналы в Microsoft Teams, корпоративная почта).

- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Соблюдение коммерческой тайны

- Основание: Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», внутренние положения компании.
- Ограничение: Запрещено разглашение информации, составляющей коммерческую тайну ООО «Букка» (бизнес-процессы, финансовые показатели, клиентские базы, условия договоров с контрагентами), за пределы проекта и круга лиц, прямо уполномоченных на ее получение. Внешние исполнители обязаны подписать NDA (Соглашение о конфиденциальности).
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Лицензионные соглашения

- Основание: Лицензионные соглашения на используемое программное обеспечение (Microsoft 365, Jira, Confluence).
- Ограничение: Запрещено использование личных аккаунтов и нелицензионного ПО для проектной работы. Обмен файлами и совместная работа должны осуществляться только через санкционированные корпоративные инструменты.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Корпоративные политики информационной безопасности

- Основание: Внутренние регламенты ООО «Букка».
- Ограничение:
- Запрещено использование незарегистрированных внешних USB-носителей для передачи проектных данных.
- Запрещена установка неавторизованного ПО для коммуникаций (например, сторонних мессенджеров).
- Доступ к корпоративным коммуникационным системам извне сети компании разрешен только через установленный VPN-клиент.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

График работы и доступность

- Основание: Правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры.
- Ограничение: Не допускается запланированное проведение совещаний и рассылка обязательных к прочтению сообщений outside рабочих часов (после 18:00 и до 9:00, в выходные и праздничные дни) для штатных сотрудников. Для внешних исполнителей действуют графики, установленные договорами.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Иерархия коммуникаций

- Основание: Организационная структура проекта.
- Ограничение: Ключевые решения и официальная позиция по проекту доводятся до заинтересованных сторон только через Руководителя проекта. Прямые коммуникации членов команды с Управляющим комитетом по проектным вопросам, минуя руководителя, не приветствуются, за исключением случаев эскалации этических нарушений.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Пропускная способность каналов связи

- Основание: Технические возможности ИТ-инфраструктуры компании.
- Ограничение: Размер вложений в электронные письма не должен превышать 25 МБ для предотвращения перегрузки почтовых серверов. Для передачи больших файлов необходимо использовать ссылки на корпоративный SharePoint или OneDrive.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Совместимость форматов

- Основание: Стандарты компании, необходимость обеспечения долгосрочной доступности документов.
- Ограничение: Для официальной документации (отчеты, ТЗ, протоколы) должны использоваться открытые или широко распространенные форматы (PDF, DOCX, XLSX). Запрещено использование узкоспециализированных или проприетарных форматов, требующих специфического ПО для просмотра.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта

Доступность систем

- Основание: Графики технического обслуживания ИТ-систем.
- Ограничение: Еженедельное техническое обслуживание корпоративных систем может проводиться в воскресенье с 02:00 до 06:00, в течение которого возможна недоступность некоторых коммуникационных инструментов. Критические коммуникации на это время не планируются.
- Действие: Учитывается при планировании совещаний и сроков.

Язык коммуникаций

- Основание: Внутренний регламент компании.
- Ограничение: Официальным языком проекта является русский язык. Вся официальная переписка, документация и совещания проводятся на русском языке. Использование английской или иной терминологии допускается только в технических спецификациях, где это необходимо для однозначности, с обязательным пояснением или приложением глоссария.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Деловой этикет

- Основание: Корпоративная культура ООО «Букка».
- Ограничение: В официальной переписке и на совещаниях принято обращаться к участникам на «Вы» по имени и отчеству, если иное не оговорено заранее. Недопустимо использование неформального или фамильярного стиля в коммуникациях с руководством и между участниками, не состоящими в дружеских отношениях.
- Действие: Рекомендовано к соблюдению всеми участниками проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий План управления коммуникациями проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С:Предприятие 8.3» представляет собой комплексную систему процессов, процедур и регламентов, направленных на обеспечение эффективного, своевременного и целенаправленного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами.

Реализация положений настоящего плана позволит создать прозрачную и предсказуемую коммуникационную среду, минимизировать риски, связанные с недостоверностью, несвоевременностью или недостаточностью информации, а также способствовать формированию общего понимания целей и статуса проекта среди всех участников.

План управления коммуникациями является динамичным инструментом и будет регулярно пересматриваться и актуализироваться по мере развития проекта, изменения состава стейкхолдеров и накопления опыта. Соблюдение установленных в плане процедур и регламентов является обязательным для всех участников проекта и служит важным условием для достижения проектных целей в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.
