

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА**

**«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ.....	4
РОЛИ И СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	5
ГРАНИЦЫ ПОЛНОМОЧИЙ.....	9
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА.....	11
ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.....	12
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.....	14
РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ.....	16
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	18
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План управления человеческими ресурсами разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» и является неотъемлемой частью Плана управления проектом. Документ определяет единые подходы и процедуры управления командой проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта - от идентификации потребностей в человеческих ресурсах до завершения работ и высвобождения участников.

Основной целью настоящего плана является создание эффективной системы управления человеческими ресурсами, направленной на:

- Обеспечение проекта квалифицированными специалистами в требуемые сроки
- Оптимизацию использования человеческих ресурсов
- Создание условий для максимальной производительности команды
- Формирование благоприятного психологического климата
- Минимизацию рисков, связанных с человеческим фактором
- Гарантированное достижение целей проекта в установленные сроки

Документ служит официальным руководством для всех участников проекта, определяя правила взаимодействия, зоны ответственности и механизмы управления командой.

План управления человеческими ресурсами распространяется на всех участников проектной команды, как внутренних, так и внешних, на руководителей функциональных подразделений, спонсора проекта и управляющий комитет, на сотрудников отделов закупок, участвующих в процессе.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

В основе управления человеческими ресурсами проекта лежат принципы:

- Проактивность - заблаговременное планирование потребностей в персонале
- Профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов
- Прозрачность - четкое определение ролей и ответственности
- Справедливость - объективная система оценки и вознаграждения
- Непрерывное развитие - постоянное повышение квалификации команды
- Безопасность - обеспечение комфортных условий труда

Управление ресурсами осуществляется на этапах планирования (идентификация потребностей, ролей и ответственности), набора (привлечение необходимых специалистов), развития (обучение и формирование команды), управления (мониторинг и контроль эффективности), завершения (оценка результатов и высвобождение ресурсов).

Реализации настоящего плана является успешной, если соблюдаются графики привлечения человеческого ресурса, достигаются плановые показатели производительности, фактическая квалификация соответствует предъявляемым требованиям, участники проекта удовлетворены условиями работы, отсутствуют существенные конфликты в команде, своевременно достигаются вехи проекта.

РОЛИ И СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Руководитель проекта.

Ответственная организация: ООО «Букка»

Ген. Директор организации: Назаров А.А.

Сфера ответственности:

- Полное управление проектом в рамках утвержденных ограничений (содержание, сроки, бюджет)
- Разработка и актуализация проектной документации
- Координация работы всех участников проектной команды

- Еженедельная отчетность перед Управляющим комитетом о статусе проекта
- Управление рисками и изменениями
- Принятие операционных решений в рамках установленных полномочий
- Обеспечение качества результатов проекта
- Управление коммуникациями между всеми заинтересованными сторонами

Полномочия:

- Подписание внутренней проектной документации
- Принятие решений в рамках бюджета до 5% стоимости контрольного счета
- Распределение задач среди членов проектной команды
- Эскалация рисков и вопросов на уровень Управляющего комитета
- Внесение корректировок в расписание в пределах резервов времени
- Оценка эффективности работы членов проектной команды

Требуемая квалификация:

- Опыт управления IT-проектами от 3 лет
- Сертификация по управлению проектами (PMI, IPMA или аналоги)
- Знание методологий управления проектами (PMBOK, Agile)
- Глубокое понимание бизнес-процессов в розничной торговле
- Навыки стратегического планирования и анализа
- Опыт управления бюджетами от 3 млн рублей
- Навыки разрешения конфликтов и ведения переговоров

Бизнес-аналитик

Ответственная организация: Внешний подрядчик ООО «Бизаналистик»

Ген. Директор организации: Листочкин Е.В.

Сфера ответственности:

- Проведение обследования текущих бизнес-процессов книжного магазина
- Сбор, анализ и документирование функциональных требований
- Разработка технического задания и спецификаций требований

- Формирование моделей бизнес-процессов «как есть» и «как будет»
- Участие в приемочном тестировании системы
- Проведение рабочих встреч с ключевыми пользователями
- Подготовка отчетов по анализу требований

Полномочия:

- Принятие решений по детализации функциональных требований
- Внесение предложений по оптимизации бизнес-процессов
- Запрос информации у сотрудников компании в рамках проекта
- Участие в оценке соответствия системы утвержденным требованиям
- Рекомендация приоритетов реализации функциональности

Требуемая квалификация:

- Опыт бизнес-анализа в IT-проектах от 2 лет
- Знание нотаций моделирования бизнес-процессов (BPMN, UML)
- Опыт работы с системами на платформе 1С: Предприятие
- Понимание специфики бизнес-процессов в розничной торговле
- Навыки проведения интервью и фасилитации встреч
- Умение работать с противоречивыми требованиями стейкхолдеров

Программист 1С

Ответственная организация: Сертифицированный партнер 1С ООО «1Супер»

Ген. Директор организации: Пугало С.Г.

Сфера ответственности:

- Настройка типовой конфигурации под требования заказчика
- Разработка дополнительных отчетов и обработок
- Доработка пользовательского интерфейса
- Реализация интеграционных механизмов с существующими системами
- Техническая документация разработанных решений
- Устранение выявленных ошибок и недочетов
- Консультирование по техническим вопросам

Полномочия:

- Выбор методов и подходов технической реализации
- Принятие решений по архитектуре доработок
- Рекомендация по оптимальным способам решения технических задач
- Участие в оценке трудоемкости доработок
- Запрос дополнительной технической информации

Требуемая квалификация:

- Сертификация «1С: Специалист по платформе»
- Опыт разработки на платформе 1С: Предприятие 8.3 от 2 лет
- Знание типовых конфигураций
- Опыт интеграции 1С с внешними системами
- Знание SQL, опыт оптимизации запросов
- Понимание принципов архитектуры информационных систем

Тестировщик

Ответственная организация: Внешний подрядчик ООО «ТестОП»

Ген. Директор организации: Бяков П.Р.

Сфера ответственности:

- Разработка тестовой стратегии и плана тестирования
- Создание тестовых сценариев и чек-листов
- Проведение функционального, регрессионного и интеграционного тестирования
- Документирование обнаруженных дефектов
- Подготовка отчетов о результатах тестирования
- Участие в приемо-сдаточных испытаниях
- Верификация исправления дефектов

Полномочия:

- Блокировка релизов при наличии критических дефектов
- Принятие решений о достаточности тестового покрытия
- Требование исправления выявленных дефектов
- Участие в оценке готовности системы к промышленной эксплуатации
- Рекомендация по приоритетам исправления дефектов

Требуемая квалификация:

- Опыт тестирования ПО от 1 года
- Знание методологий и видов тестирования
- Базовые знания SQL для проверки данных
- Понимание жизненного цикла разработки ПО
- Внимательность к деталям и системный подход к работе

Тренер

Ответственная организация: Сертифицированный учебный центр ООО «ТренГоу»

Ген. Директор организации: Карликов О.Д.

Сфера ответственности:

- Разработка учебных программ и материалов
- Проведение обучения для различных групп пользователей
- Адаптация учебных материалов под специфику компании
- Проведение оценки эффективности обучения
- Консультирование пользователей в процессе обучения
- Подготовка отчетов по результатам обучения
- Разработка тестов для проверки знаний

Полномочия:

- Принятие решений о методах и формах проведения обучения
- Оценка готовности пользователей к работе в системе
- Рекомендация по дополнительному обучению сотрудников
- Корректировка учебных программ по результатам обучения
- Требование обеспечения необходимых условий для проведения обучения

Требуемая квалификация:

- Сертификация 1С по соответствующим конфигурациям
- Опыт проведения тренингов от 1 года
- Знание предметной области (розничная торговля)
- Навыки публичных выступлений и презентаций
- Умение адаптировать сложный материал для разных аудиторий
- Опыт разработки учебных материалов и тестов

ГРАНИЦЫ ПОЛНОМОЧИЙ

Уровни принятия решений:

- Операционные решения (в рамках утвержденного плана) - руководитель проекта
- Тактические решения (изменения в пределах 5% бюджета/сроков) - Управляющий комитет
- Стратегические решения (изменения содержания, бюджета свыше 10%) - Спонсор проекта

Ограничения полномочий:

- Руководитель проекта не имеет права привлекать дополнительных сотрудников без согласования
- Внешние исполнители не имеют доступа к конфиденциальной информации компании
- Все участники проекта обязаны соблюдать политики информационной безопасности

Для обеспечения эффективного разрешения вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации проекта, устанавливается многоуровневая система эскалации. Данная процедура гарантирует своевременное принятие решений на соответствующем уровне ответственности и предотвращает блокировку работ по проекту.

Уровни эскалации и их полномочия:

Уровень 1: Решение в рамках проектной команды

- Участники: Исполнители работ, ответственные за выполнение конкретных задач
- Компетенция: Решение операционных вопросов, не требующих изменения содержания, сроков или бюджета проекта
- Срок рассмотрения: В течение 1 рабочего дня

Уровень 2: Эскалация руководителю проекта

- Участники: Руководитель проекта, ответственные исполнители
- Компетенция: Решение тактических вопросов, влияющих на отдельные задачи в рамках утвержденного плана
- Срок рассмотрения: В течение 1 рабочего дня с момента эскалации

Уровень 3: Эскалация в Управляющий комитет проекта

- Участники: Управляющий комитет в составе Спонсора проекта и Генерального директора, Руководитель проекта
- Компетенция: Решение стратегических вопросов, требующих изменения утвержденных параметров проекта
- Срок рассмотрения: В течение 3 рабочих дней с момента эскалации

Уровень 4: Эскалация Спонсору проекта

- Участники: Спонсор проекта, Генеральный директор, Руководитель проекта
- Компетенция: Решение критических вопросов, оказывающих существенное влияние на успех проекта
- Срок рассмотрения: В течение 2 рабочих дней с момента эскалации

В случае возникновения разногласий между руководителем проекта и членами команды, которые не могут быть разрешены на уровне проекта, вопрос подлежит немедленной эскалации в Управляющий комитет. При возникновении конфликта интересов или этических вопросов, участник проекта имеет право прямого обращения к Спонсору проекта в обход стандартной процедуры эскалации.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

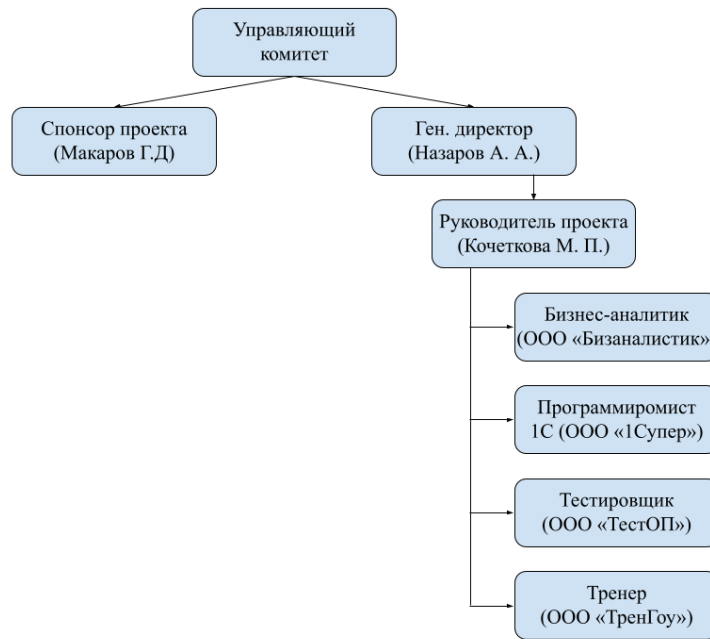


Рисунок 1. Организационная структура

Стратегический уровень управления:

- Управляющий комитет проекта - высший орган управления проектом
- Состав: Спонсор проекта (Макаров Г.Д.), Генеральный директор (Назаров А.А.)
- Функции: утверждение ключевых решений, стратегическое руководство, разрешение эскалированных вопросов

Тактический уровень управления:

- Руководитель проекта (Кочеткова М.П.) - центральное звено управления
- Функции: операционное управление проектом, координация команды, отчетность перед УК

Операционный уровень управления:

- Команда проекта - исполнители работ по направлениям
- Функции: выполнение задач в рамках своих компетенций, отчетность о прогрессе

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

План обеспечения персоналом определяет стратегию и тактику привлечения, управления и высвобождения человеческих ресурсов проекта. Основной принцип - оптимальное сочетание внутренних и внешних ресурсов для достижения целей проекта в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета. Обеспечение проекта персоналом осуществляется с учетом требований к квалификации, опыту и доступности ресурсов.

Стратегия набора персонала.

Внутренние ресурсы компании

Руководитель проекта:

- Источник: штатный сотрудник ООО «Букка»
- Процесс привлечения: приказ по компании о назначении
- Занятость в проекте: полная (100%)
- Срок привлечения: с 01.08.2025 по 31.12.2025
- Преимущества: знание специфики бизнеса, существующие связи в компании

Ключевые пользователи:

- Источник: сотрудники торгового отдела, склада, бухгалтерии
- Количество: 4 человека (2 - торговый отдел, 1 - склад, 1 - бухгалтерия)
- Процесс привлечения: выделение приказом с согласованием руководителей подразделений
- Занятость в проекте: частичная (20-30% времени)
- Срок привлечения: поэтапно, в соответствии с календарным планом
- Обоснование: обеспечение релевантности требований и приемки результатов

Внешние ресурсы

Бизнес-аналитик:

- Источник: специализированная консалтинговая компания
- Процесс привлечения: конкурсный отбор по упрощенной процедуре
- Требования: опыт в торговой отрасли, знание 1С, сертификации
- Срок привлечения: 01.08.2025 - 30.09.2025

- Форма сотрудничества: договор возмещаемых затрат

Программист 1С:

- Источник: сертифицированный партнер 1С
- Процесс привлечения: выбор из числа аккредитованных поставщиков
- Требования: сертификация «1С:Специалист», опыт аналогичных проектов
- Срок привлечения: 15.08.2025 - 15.11.2025
- Форма сотрудничества: договор с фиксированной ценой

Тестировщик:

- Источник: ИТ-компания с QA-направлением
- Процесс привлечения: выбор по результатам тестового задания
- Требования: опыт тестирования ERP-систем, знание методологий тестирования
- Срок привлечения: 01.09.2025 - 30.11.2025
- Форма сотрудничества: договор времени и материалов

Тренер:

- Источник: сертифицированный учебный центр 1С
- Процесс привлечения: выбор по программе обучения и стоимости
- Требования: сертификация 1С-тренера, опыт в торговой отрасли
- Срок привлечения: 01.10.2025 - 30.11.2025
- Форма сотрудничества: договор с фиксированной ценой

Должность	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Руководитель проекта	120	120	120	120	80	560
Бизнес-аналитик	160	120	40	-	-	320
Программист 1С	80	160	160	80	-	480
Тестировщик	-	40	120	80	-	240
Тренер	-	-	40	80	-	120
Ключевые показатели	40	80	120	80	40	360
ИТОГО	400	520	600	440	120	2080

Таблица 1. График задействования человеческих ресурсов (человеко-часов в месяц)

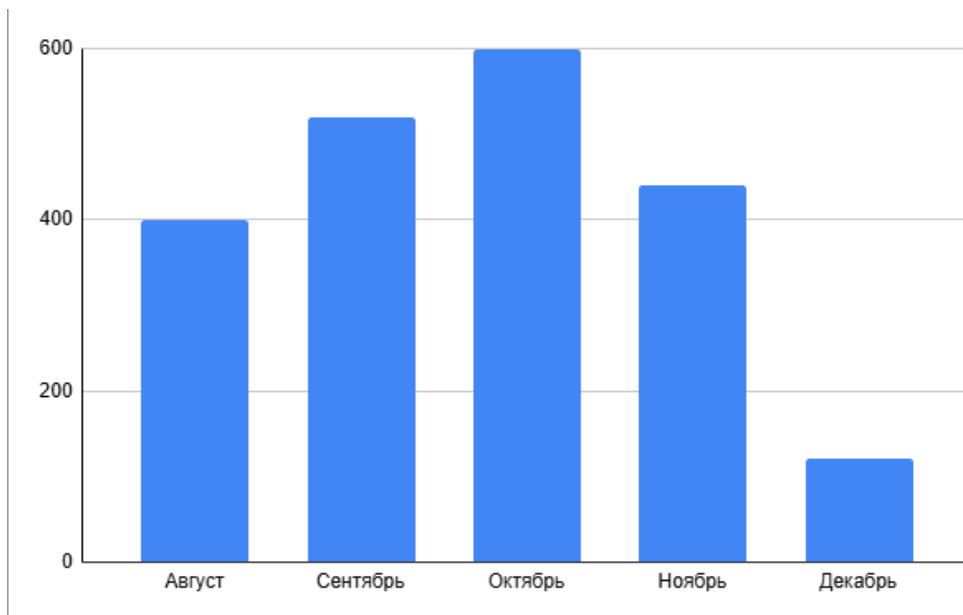


Рисунок 2. Гистограмма распределения ресурсов

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Процесс онбординга новых участников

Для внутренних сотрудников:

- Ознакомительная встреча с руководителем проекта (2 часа)
- Изучение устава проекта и регламентов (4 часа)
- Вводный инструктаж по проектной документации (2 часа)
- Общий срок онбординга: 1 рабочий день

Для внешних исполнителей:

- Подписание NDA и соглашений о конфиденциальности
- Получение доступа к проектным системам и документации
- Вводный брифинг по бизнес-процессам компании (4 часа)
- Знакомство с командой и установление коммуникационных каналов
- Общий срок онбординга: 2 рабочих дня

Мониторинг и контроль рабочего времени осуществляются с целью обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов проекта, своевременного выявления отклонений и принятия корректирующих действий. Основной принцип - прозрачность учета и справедливость оценки трудозатрат всех участников проекта.

- Система учета: корпоративная система учета рабочего времени

- Периодичность отчетности: еженедельная
- Форма отчетности: утвержденный шаблон с детализацией по задачам
- Контроль переработок: лимит 10% от планового времени в месяц

План высвобождения персонала.

Бизнес-аналитик:

- Условие высвобождения: подписание утвержденного технического задания
- Срок: до 30.09.2025
- Процедура: передача документации, закрывающий отчет
- Формальности: акт сдачи-приемки работ

Программист 1С:

- Условие высвобождения: успешное завершение тестирования всех модулей
- Срок: до 15.11.2025
- Процедура: передача исходных кодов, технической документации
- Формальности: акт сдачи-приемки работ

Тестировщик:

- Условие высвобождения: подписание акта приемочных испытаний
- Срок: до 30.11.2025
- Процедура: передача тестовой документации, отчетов
- Формальности: акт сдачи-приемки работ

Тренер:

- Условие высвобождения: завершение обучения всех групп пользователей
- Срок: до 30.11.2025
- Процедура: передача учебных материалов, отчетов по обучению
- Формальности: акт сдачи-приемки работ

Ключевые пользователи:

- Условие высвобождения: полный переход на промышленную эксплуатацию

- Срок: до 15.12.2025
- Процедура: финальный опрос удовлетворенности, сбор обратной связи

Руководитель проекта:

- Условие высвобождения: полное закрытие проекта, архивация документации
- Срок: до 31.12.2025
- Процедура: итоговый отчет, передача документов на хранение

РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ

Развитие команды проекта направлено на формирование высокопроизводительной рабочей группы, способной эффективно достигать поставленных целей в установленные сроки. Стратегия основана на принципах непрерывного обучения, профессионального роста и создания благоприятной психологической атмосферы. Основной акцент делается на развитии как технических, так и управленческих компетенций участников проекта.

Для руководителя проекта:

- Курс: "Управление IT-проектами в условиях неопределенности"
- Продолжительность: 24 академических часа
- Формат: очный с отрывом от производства
- Срок проведения: август 2025 года
- Поставщик: сертифицированный учебный центр
- Ожидаемый результат: повышение эффективности управления рисками и изменениями

Для бизнес-аналитика:

- Курс: "Современные методики сбора и анализа требований"
- Продолжительность: 16 академических часов
- Формат: онлайн-обучение
- Срок проведения: сентябрь 2025 года
- Поставщик: профессиональная ассоциация бизнес-аналитиков
- Ожидаемый результат: улучшение качества технического задания

Для программиста 1С:

- Курс: "Новые возможности платформы 1С: Предприятие 8.3"
- Продолжительность: 32 академических часа
- Формат: очно-заочный
- Срок проведения: август-сентябрь 2025 года
- Поставщик: учебный центр 1С
- Ожидаемый результат: применение современных инструментов разработки

Для тестировщика:

- Курс: "Автоматизация тестирования бизнес-приложений"
- Продолжительность: 20 академических часов
- Формат: онлайн-обучение
- Срок проведения: октябрь 2025 года
- Поставщик: специализированная IT-компания
- Ожидаемый результат: повышение эффективности тестирования

Базовый курс для всех пользователей:

- Наименование: "Работа в системе 1С для начинающих"
- Продолжительность: 8 академических часов
- Формат: очное обучение в группах по 5-8 человек
- Количество групп: 3
- Срок проведения: ноябрь 2025 года
- Преподаватель: сертифицированный тренер 1С
- Критерий успеха: сдача практического теста

Углубленный курс для администраторов:

- Наименование: "Администрирование и сопровождение"
- Продолжительность: 16 академических часов
- Формат: очное обучение
- Количество участников: 2 человека
- Срок проведения: ноябрь 2025 года
- Преподаватель: технический специалист внедренческой компании
- Критерий успеха: выполнение практических заданий

Курс для руководителей:

- Наименование: "Аналитика и отчетность"

- Продолжительность: 4 академических часа
- Формат: индивидуальные консультации
- Количество участников: 3 человека
- Срок проведения: декабрь 2025 года
- Преподаватель: бизнес-аналитик проекта
- Критерий успеха: умение формировать основные отчеты

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Система мотивации

- Критерии оценки эффективности:
 - Соблюдение сроков выполнения задач (вес 30%)
 - Качество выполняемой работы (вес 40%)
 - Вклад в развитие команды (вес 20%)
 - Соблюдение бюджета (вес 10%)
- Формы вознаграждения:
 - Ежемесячные бонусы: до 20% от месячного оклада за достижение плановых показателей
 - Этапные премии: за успешное достижение ключевых вех проекта
 - Финальная премия: до 50% от месячного оклада по результатам успешного завершения проекта
 - Нематериальное признание: благодарности, сертификаты, доска почета

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Проект осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения. В рамках проекта гарантируется:

- Соблюдение установленной продолжительности рабочего времени (не более 40 часов в неделю)
- Обеспечение права на отдых и выходные дни
- Соблюдение процедур привлечения к сверхурочной работе
- Соблюдение гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством

- Соблюдение требований к охране труда и безопасности рабочего места

Привлечение внешних исполнителей осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"
- Внутренними регламентами закупочной деятельности ООО «Букка»
- Требованиями к конкурсным процедурам и отбору поставщиков

Все договоры с внешними исполнителями содержат положения о:

- Соблюдении конфиденциальности информации
- защите интеллектуальной собственности
- Ответственности за нарушение обязательств
- Порядке разрешения споров

Деятельность в рамках проекта осуществляется в соответствии с:

- Положением о проектной деятельности ООО «Букка»
- Кодексом корпоративной этики
- Политикой информационной безопасности
- Регламентом управления персоналом
- Правилами внутреннего трудового распорядка

Управление проектом осуществляется в соответствии с:

- Внутренним стандартом управления проектами
- Методологией PMI PMBOK Guide
- Корпоративными шаблонами и регламентами
- Требованиями к проектной документации

В рамках проекта обеспечивается полное соответствие требованиям:

- Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных"
- Внутренней политики обработки персональных данных
- Требованиям к защите конфиденциальной информации

Меры по защите персональных данных:

- Все участники проекта подписывают соглашение о неразглашении
- Ограничение доступа к персональным данным на основе ролевой модели

- Ведение журналов доступа и операций с данными
- Регулярное обучение участников проекта требованиям безопасности

Проект предусматривает меры по защите коммерческой тайны компании:

- Классификация информации по уровням конфиденциальности
- Ограничение доступа к стратегической информации
- Контроль распространения проектной документации
- Регулярный аудит соблюдения режима коммерческой тайны

Обеспечиваются безопасные условия труда для всех участников проекта:

- Проведение вводного инструктажа по охране труда
- Обеспечение средствами индивидуальной защиты (при необходимости)
- Соблюдение требований к организации рабочих мест
- Регулярный контроль условий труда

Для внешних исполнителей устанавливаются дополнительные требования:

- Предоставление документов, подтверждающих допуск к работам
- Соблюдение правил внутреннего распорядка компании
- Прохождение обязательного инструктажа по технике безопасности
- Соблюдение требований к работе с оборудованием и системами

Внедряемая система должна соответствовать:

- Отраслевым стандартам розничной торговли
- Требованиям к системам автоматизации торговли
- Стандартам интеграции с онлайн-кассами
- Требованиям к формированию фискальной отчетности

Участники проекта должны соответствовать:

- Профессиональным стандартам в области IT
- Требованиям к квалификации специалистов 1С
- Стандартам в области управления проектами
- Требованиям к бизнес-аналитикам в торговой отрасли

Проект осуществляется с соблюдением:

- Требований природоохранного законодательства
- Корпоративной политики в области экологии

- Требований к утилизации оборудования
- Норм энергоэффективности используемых решений

Соблюдение установленных требований является обязательным для всех участников проекта. Руководитель проекта несет персональную ответственность за организацию работы по обеспечению соответствия требованиям и регулярно отчитывается перед Управляющим комитетом о состоянии дел в данной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий План управления человеческими ресурсами представляет собой комплексную систему процессов и процедур, направленных на эффективное управление командой проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3». Документ устанавливает четкие рамки и регламенты для всех аспектов работы с человеческими ресурсами на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Разработанный план обеспечивает:

- Четкое распределение ролей и ответственности между всеми участниками проекта, что исключает дублирование функций и обеспечивает подотчетность за результаты работы.
- Эффективную организационную структуру, построенную по матричному принципу, который сочетает преимущества функционального и проектного управления.
- Оптимальное планирование обеспечения персоналом, учитывающее как потребности проекта, так и возможности компании по предоставлению внутренних ресурсов и привлечению внешних специалистов.
- Системный подход к развитию команды, включающий программы обучения, мероприятия по формированию команды и продуманную систему мотивации и признания заслуг.
- Полное соответствие нормативным требованиям трудового законодательства, корпоративных стандартов и отраслевых регламентов.
- Процедуры мониторинга и контроля, позволяющие своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие действия.

Реализация положений настоящего плана позволит создать высокопроизводительную команду, способную достичь целей проекта в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета. Системный подход к управлению человеческими ресурсами минимизирует риски, связанные с человеческим фактором, и обеспечит благоприятный психологический климат в проектной команде.

План управления человеческими ресурсами является динамичным инструментом управления и может корректироваться по мере развития

проекта в установленном порядке изменений. Регулярный мониторинг показателей эффективности управления человеческими ресурсами и своевременная адаптация процессов позволят обеспечить достижение проектных целей.

Соблюдение положений настоящего плана гарантирует системный подход к управлению человеческими ресурсами и способствует успешной реализации проекта в целом.
